新病院整備だより

号外

みなさんの生活を支える公立病院

【新病院建築の進捗について】

新病院建築においては、昨年度、実施設計が完了し、令和7年6月の新病院開院に向けて、本年より工事に着手します。今年度は、昨今の物価上昇による不落のリスクを緩和するために、4月から6月にかけて、実施設計単価に対する単価入替えを行いました。単価入替え後の全体事業費は先日の7月議会にてご説明させていただき、今年度着手事業については、予算を可決いただきました。

【病院再整備事業全体事業費について】

新病院建築工事も含めた全体事業費については、今回の議会説明では、約35億円となっています。設計業務では、物価上昇による影響を最小限とするために、採用する資材の見直しなど事業費削減に対する取組も行ってきましたが、新病院の機能性の維持（感染症対策としての待合面積の増、冬期間の雪庇対策）なども考慮して検討した結果、当初計画より約7億円の事業費増となっています。

全体事業費は増となっていますが、財源としている補助金も当初計画より約2億円増の約4億円を見込んでおり、病院再整備事業に伴う町負担を軽減できるよう努めています。

【建築工事スケジュールについて】

新病院建築工事のスケジュールは上記のとおりとなっており、施工業者の選定条件を検討した後、7月下旬頃を目処に工事公告ができるよう進めております。建築工事（新病院本体工事）は、令和5・6年度の2カ年の契約での工事を計画しており、10月に着工し、冬期間約3カ月の休工を含んだ18カ月の工期を予定しています。

引き続き、地域の健康と暮らしを支え、身近で信頼され愛される病院を目指して整備を進めたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。

【新病院建築工事スケジュール（令和５年度）】

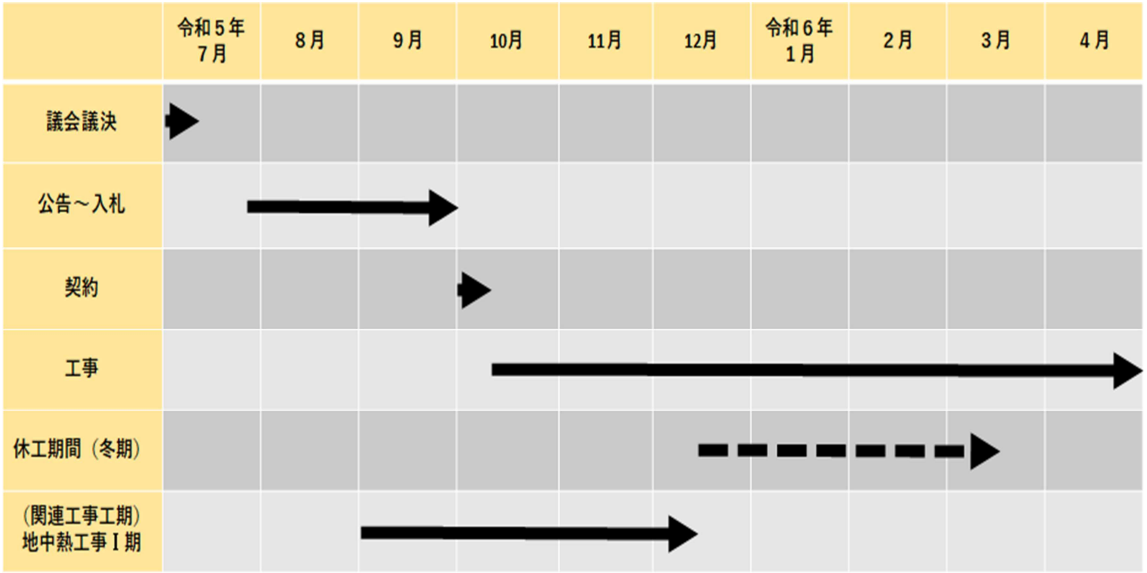

※上記スケジュールは予定となります。工事の進捗などにより予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

信越病院☎（２５５）３１００
