■概略工程表（参考）

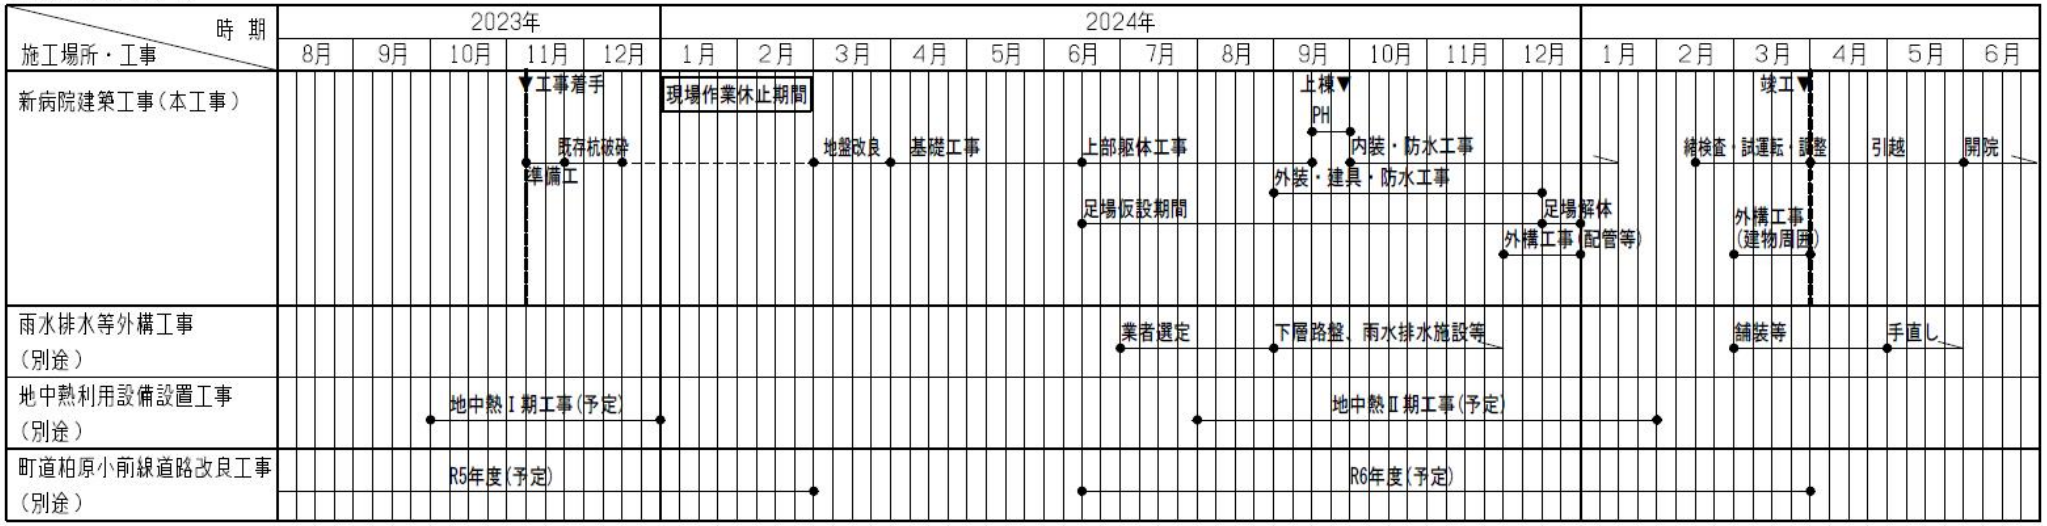
時期
施工場所・工事
2023年
2024年
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
新病院建築工事（本工事）
工事着手
準備工
既存杭破砕
現場作業休止期間
地盤改良
基礎工事
上部躯体工事
足場仮設期間
上棟
PH
内装・防水工事
外装・建具・防水工事
足場解体
外構工事
配管等
竣工
総検査・試運転・調整
外構工事
（建物周囲）
引越
開院
雨水排水等外構工事
（別途）
業者選定
下層路盤、雨水排水施設等
舗装等
手直し
地中熱利用設備設置工事
（別途）
地中熱Ⅰ期工事（予定）
地中熱Ⅱ期工事（予定）
町道柏原小前線道路改良工事
（別途）
R5年度（予定）
R6年度（予定）
